



150893.

24

TODOS POR UN  
<http://sala.pereira.gov.co>

**FONDO ROTATORIO DE LA F  
"SERVICIO CON PROBIID"**

ALCALDIA DE PEREIRA  
Subsección No. 50093-2015  
Fecha: 01/09/2015  
Recibido por: ISE María Buitrago  
Destino: Fondo Rotatorio de Servicio de Informática



Bogotá, 01-09-2015

Doctor  
**ENRIQUE ANTONIO VÁSQUEZ ZULETA**  
*Alcalde Municipal*  
Carrera 7 No. 18-55 Piso 4  
Pereira - Risaralda

Atención:  
**Ingeniero NELSON LÓPEZ LONDOÑO**  
Supervisor del Convenio Interadministrativo 1915 de 2014  
e-mail: [contactenos@pereira.gov.co](mailto:contactenos@pereira.gov.co); [beatrizramirez@gmail.com](mailto:beatrizramirez@gmail.com)

Asunto: Informe de ejecución No.4 Convenio Interadministrativo 1915 de 2014.

En cumplimiento a las obligaciones contraídas por nuestra Entidad en el marco del Convenio Interadministrativo 1915 de 2014, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR LOS TRÁMITES PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES NECESARIOS CON EL FIN DE REALIZAR LA "ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD (SIES), CONJUNTAMENTE CON EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA", me permito remitir el informe preparado por nuestro supervisor respecto a la ejecución del convenio, para el periodo Mayo 21 - Agosto 20 de 2015. Para cualquier información adicional puede comunicarse con nuestro supervisor designado cuya información de contacto es la siguiente:

Nombre: Subteniente **SERGIO ANDRÉS PINEDA VELÁSQUEZ**  
Número de teléfono celular: (311) 886 2648  
Correo electrónico: [sergio.pineda1034@correo.policia.gov.co](mailto:sergio.pineda1034@correo.policia.gov.co)

Atentamente,

Administradora Pública **ROSSANA DÍAZ GÓMEZ**  
Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos  
Anexo Informe en 7 folios.  
Ejecutó: Mg. Elena García Vélez - Profesional de Derecho LONDOÑO, E.G.V.  
Ubicación: COCONTRATO INTERADMINISTRATIVO F124-2014



Sede Administrativa: Cra. 60A No. 43-18  
Commutador: 2200480  
Complejo industrial: Cra. 48 N° 46-08 Sur  
Commutador 7400558 - 5640788  
[www.fonpro.gov.co](http://www.fonpro.gov.co)



F-3.4-01V12



**MINDEFENSA**



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**



**FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**

**INFORME No. 4  
21 DE MAYO - 20 DE AGOSTO 2015  
EJECUCIÓN PROYECTO CCTV  
CONVENIO 1915 - 2014  
PEREIRA - RISARALDA**



Disponible a: 7-44400000  
2015 Colombia  
Formación y desarrollo de recursos  
para Colombia y el mundo.

**"SERVICIO CON PROBIIDAD"**

Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460  
Complejo industrial: Cra 46 N° 46-08 Sur Conmutador 7400558 - 5840788

[www.fonro.gov.co](http://www.fonro.gov.co)



ISO 9001



BC-CE144671

**1. Grupo 3: UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD CIUDADANA**

El 30 de Abril de 2015, se firmó el Contrato de Compraventa No. 064-1-2015 cuyo objeto es: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBA, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES – SUBSISTEMA 123, CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN) Y SEGURIDAD ESTADIO" de la siguiente forma:

3	6	RISARALDA	PEREIRA	123 - CCTV	\$ 6.161.500.071.0
---	---	-----------	---------	------------	--------------------

**2. AVANCES DE FASES PROYECTO DE 123 – CCTV PEREIRA (RISARALDA).**

El avance total de ejecución en el proyecto 123 -CCTV del municipio de Pereira a fecha 31 de Julio de 2015 es del 22,15%, del avance planeado del proyecto (20,48%) por el avance ejecutado del proyecto. Evidencia que el proyecto tiene un atraso del 1,68%.

A continuación se muestra la tabla resumen de ejecución y la gráfica de avance del proyecto con corte a 31 de Julio de 2015.

Fecha Corte	Monto	Presup	Comprom	Ejecu	Saldo	Saldo	Presup	Comprom	Ejecu	Saldo	Presup	Comprom	Ejecu	Saldo	Presup	Comprom	Ejecu
Proyecto Planeado	6.161,500,071.0	1,000,000,000.0	3,400,000,000.0	1,300,000,000.0	4,861,500,071.0	2,100,000,000.0	2,100,000,000.0	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	1,100,000,000.0	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	1,100,000,000.0	1,100,000,000.0	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	1,100,000,000.0
Proyecto Ejecutado	1,368,000,000.0	1,368,000,000.0	2,032,000,000.0	1,300,000,000.0	7,168,000,000.0	2,100,000,000.0											
Porcentaje Variación																	

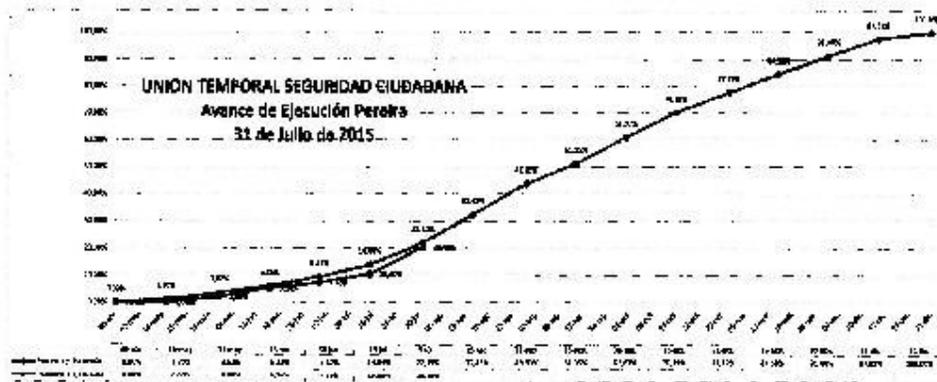


Gráfico 1. Avance Pereira 31 de julio

**"SERVICIO CON PROBIIDAD"**

Sede Administrativa: Cra. 86A No. 43-18 Comutador 2200460  
 Complejo Industrial: Cra 48 N° 46-08 Sur Comutador 7400568 - 6840789  
[www.forpo.gov.co](http://www.forpo.gov.co)

FASE:	FASE 3: ADQUISICIONES		fecha de corte: 31 de julio de 2015		
% Planeado	59,23%	% Ejecutado	67,20%	Variación (%)	7,97%
ENTREGABLE	PAQUETE DE TRABAJO		PLANEADO	EJECUTADO	VARIACION
			Julio 31 "	Julio 31 "	Julio 31 "
COMPRAS INTERNACIONALES	Sistemas Control de Acceso		60,56%	10,00%	-50,56%
COMPRAS INTERNACIONALES	Sistemas Control de Entrada		60,56%	0,00%	-50,56%
TRANSPORTE Y LOGISTICA INTERNACIONAL			45,39%	0,00%	-45,39%
TRANSPORTE Y LOGISTICA INTERNACIONAL	Transporte de origen a zona aduanera/franca/dispositivo aduanero		45,39%	0,00%	-45,39%
COMPRAS NACIONALES			47,28%	24,00%	-23,28%
COMPRAS NACIONALES	Gabinetes y KIT elementos de paste		60,39%	10,00%	-50,39%
COMPRAS NACIONALES	Sistema Eléctrico		52,27%	24,00%	-28,27%
COMPRAS NACIONALES	Cableado Estructurado		52,27%	10,00%	-42,27%
COMPRAS NACIONALES	Móvilizario		43,67%	10,00%	-33,67%
COMPRAS NACIONALES	Sistema de Alarmas Retenido		43,67%	10,00%	-33,67%
COMPRAS NACIONALES	UPS		43,67%	10,00%	-33,67%

**COMENTARIOS:** a corte del presente informe se registran adelantos en la ejecución de la fase. Se seguirán realizando las gestiones comerciales necesarias para la adquisición de los equipos pasivos y activos que componen el sistema.

FASE:	FASE 4: IMPORTACION Y MOVILIZACION A SITIO		fecha de corte: 31 de julio de 2015		
% Planeado	23,26%	% Ejecutado	31,6%	Variación (%)	17,10%
ENTREGABLE	PAQUETE DE TRABAJO		PLANEADO	EJECUTADO	VARIACION
			Julio 31 "	Julio 31 "	Julio 31 "
FASE: IMPORTACION Y MOVILIZACION A SITIO			23,26%	3,16%	-17,10%
NACIONALIZACION DE EQUIPOS			31,59%	3,83%	-27,76%
NACIONALIZACION DE EQUIPOS	Trámite con DIAN mandato general para importaciones		73,63%	0,00%	-73,63%
NACIONALIZACION DE EQUIPOS	Trámite de licencia de importación		36,36%	0,00%	-36,36%
NACIONALIZACION DE EQUIPOS	Reflexión solidaria exención IVA desde UT al PORPO		73,63%	0,00%	-73,63%
NACIONALIZACION DE EQUIPOS	Certificación de exención de IVA del forpo		42,86%	0,00%	-42,86%
NACIONALIZACION DE EQUIPOS	Recepción de mercancías en zona aduanera/puerto		17,65%	0,00%	-17,65%

**COMENTARIOS:** la Unión Temporal Seguridad Ciudadana constituyó la póliza para importaciones y está en trámite de aprobación. Se continuaran realizando los trámites necesarios para completar la documentación respectiva para la importación de equipos, de esta manera una vez dichos equipos ingresen a zona franca se surtirá el trámite de nacionalización de los mismos.

**"SERVICIO CON PROBIIDAD"**

Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Comutador 2200480  
 Complejo Industrial Cra 48 N° 46-08 Sur Comutador 7400558 - 5640788  
[www.forpo.gov.co](http://www.forpo.gov.co)

#### 4. ESTADO DE PERMISOS

A continuación se relaciona el municipio del estado de los permisos de acuerdo con las gestiones realizadas por la Interventoría, los contratistas y la supervisión en cada uno de los municipios del proyecto. Así mismo, se remite copia de los permisos otorgados por los entes territoriales, en formato digital.

3	Risaraldá	Pereira	OK	OK	NO	OK	NO

Se presenta la ejecución del proyecto con base en el último informe oficial por parte de la interventoría del proyecto, por lo tanto el avance agosto será incluido en el siguiente informe de ejecución



*Sergio Andrés Pineda Velásquez*

Subteniente **SERGIO ANDRÉS PINEDA VELASQUEZ**  
 Supervisor Convenio Interadministrativo 1915-2014  
 Por parte del Fondo Rotatorio de la Policía

**"SERVICIO CON PROBIDAD"**

Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Comutador 2200460  
 Complejo Industrial: Cra 48 N° 46-08 Sur Comutador 7400566 - 6640788  
[www.fondo.gov.co](http://www.fondo.gov.co)

<b>FASE:</b>	<b>FASE 5: OBRAS Y ADECUACIONES (CIVILES /ELÉCTRICAS)</b>		<b>fecha de corte: 31 de julio de 2015</b>		
<b>% Planeado</b>	<b>8,04%</b>	<b>% Ejecutado</b>	<b>0%</b>	<b>Variación (%)</b>	<b>-8,04%</b>
<b>ENTREGABLE</b>	<b>PAQUETE DE TRABAJO</b>	<b>PLANEADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>VARIACION</b>	
		Julio 31	Julio 31	Julio 31	
<b>FASE: OBRAS Y ADECUACIONES (CIVILES / ELÉCTRICAS)</b>		8,04%	0,00%	-8,04%	
<b>PLANTA EXTERNA</b>		8,67%	0,00%	-8,67%	
PLANTA EXTERNA	Posto	23,73%	0,00%	-23,73%	
PLANTA EXTERNA	SPT Postes	10,60%	0,00%	-10,60%	
PLANTA EXTERNA	Canalización para último tramo de fibra óptica	10,60%	0,00%	-10,60%	
<b>NODOS DE FIBRA EXISTENTE</b>		11,86%	0,00%	-11,86%	
NODOS DE FIBRA EXISTENTE	Intervención en puntos de cámara	23,73%	0,00%	-23,73%	
<b>PLANTA INTERNA</b>		6,30%	0,00%	-6,30%	
PLANTA INTERNA	Despeje de área (Equipo, mobiliarios, tomas eléctricas, tableros eléctricos, canalistas eléctricas e de datos, etc)	23,73%	0,00%	-23,73%	
PLANTA INTERNA	Adecuación y/o construcciones civiles	10,60%	0,00%	-10,60%	
PLANTA INTERNA	Instalación de ductería	10,60%	0,00%	-10,60%	
PLANTA INTERNA	Cubiertas e impermeabilización	1,59%	0,00%	-1,59%	
PLANTA INTERNA	Alisamiento de muros	10,60%	0,00%	-10,60%	
PLANTA INTERNA	SPT COM	7,53%	0,00%	-7,53%	
<b>COMENTARIOS:</b> la Unión Temporal Seguridad Ciudadana dará inicio a la obra en calle una vez se tenga el permiso de intervención de vías y espacio público. En cuanto a las obras y adecuaciones civiles para centro de control estas darán inicio en el mes de agosto de 2015.					

<b>FASE:</b>	<b>FASE 6: PRECONFIGURACIÓN DE EQUIPOS</b>		<b>fecha de corte: 31 de julio de 2015</b>		
<b>% Planeado</b>	<b>6,15%</b>	<b>% Ejecutado</b>	<b>0%</b>	<b>Variación (%)</b>	<b>-6,15%</b>
<b>ENTREGABLE</b>	<b>PAQUETE DE TRABAJO</b>	<b>PLANEADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>VARIACION</b>	
		Julio 31	Julio 31	Julio 31	
<b>FASE: PRECONFIGURACION DE EQUIPOS</b>		6,15%	0,00%	-6,15%	
<b>COMENTARIOS:</b> Esta fase dará inicio una vez los equipos importados estén en zona franca en proceso de nacionalización. Y para aquellos equipos comprados a nivel nacional se realizará la pre configuración cuando reposen en la bodega de la UT Seguridad ciudadana.					

<b>FASE:</b>	<b>FASE 8: DOCUMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y ENTREGA</b>		<b>fecha de corte: 31 de julio de 2015</b>		
<b>% Planeado</b>	<b>12,15%</b>	<b>% Ejecutado</b>	<b>17,05%</b>	<b>Variación (%)</b>	<b>4,90%</b>
<b>ENTREGABLE</b>	<b>PAQUETE DE TRABAJO</b>	<b>PLANEADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>VARIACION</b>	
		Julio 31	Julio 31	Julio 31	
<b>FASE: DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA</b>		12,15%	17,05%	4,90%	
<b>COMENTARIOS:</b> Esta fase presenta un adelanto del 4,90%, se espera continuar con esta tendencia. A medida que se termine cada fase del proyecto se realizará la inclusión de documentos de recibo final.					

**"SERVICIO CON PROBIIDAD"**

Sede Administrativa: Cra. 86A No. 43-18 Conmutador 2200480  
 Complejo Industrial: Cra 48 N° 45-08 Sur Conmutador 7400668 6640788  
[www.torpo.gov.co](http://www.torpo.gov.co)

## 3. PAQUETES DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA

FASE:	FASE 1: TSS Y DISEÑOS		fecha de corte: 31 de julio de 2015	
% Planeado	88,62%	% Ejecutado	78,56%	Variación (%) -10,06%
ENTREGABLE	PAQUETE DE TRABAJO	PLANEADO Julio 31	EJECUTADO Julio 31	VARIACION Julio 31
DEFINICION DE ALCANCE EN NODOS DE FIBRA O RADIO ENLACES EXISTENTE		63,03%	10,20%	-52,87%
DEFINICION DE ALCANCE EN NODOS DE FIBRA O RADIO ENLACES EXISTENTE	TSS nodos	92,94%	0,00%	-92,94%
DEFINICION DE ALCANCE EN NODOS DE FIBRA O RADIO ENLACES EXISTENTE	Diseño de Interconexión de nodos	83,33%	0,00%	-83,33%
<b>PLANES DE CAPACITACION</b>		57,33%	39,20%	-17,63%
PLANES DE CAPACITACION	Plan Capacitación en el Exterior: 1 material didáctico	55,28%	20,00%	-35,28%
PLANES DE CAPACITACION	Plan Capacitación operativa de entrega en Sitio	39,69%	10,00%	-29,69%

**COMENTARIOS:**

En relación a los diseños de planta interna y externa para la ciudad de Perelra, estos se encuentran aprobados por parte de la interventoría. Para la definición de radio enlaces / nodos la Unión Temporal Seguridad Ciudadana adelantará en la primera semana del mes de agosto un trabajo conjunto con la interventoría en sitio para realizar la definición de alcance de nodos y/o radioenlaces.

Para los planes de capacitación la UTSC continuará con las gestiones correspondientes a agendamientos, invitaciones, trámites de permisos de viaje entre otros; de este modo se estima ponerse al día con lo planeado para estas actividades en el corte del 30 de agosto de 2015.

FASE:	FASE 2: GESTIÓN DE PERMISOS		fecha de corte: 31 de julio de 2015	
% Planeado	40,10%	% Ejecutado	69,40%	Variación (%) 29,30%
ENTREGABLE	PAQUETE DE TRABAJO	PLANEADO Julio 31	EJECUTADO Julio 31	VARIACION Julio 31
<b>FASE 2: GESTIÓN DE PERMISOS</b>		40,10%	69,40%	29,30%

**COMENTARIOS:** a la fecha se cuenta con los permisos de suministro de energía y adecuación de centro de control. La Unión Temporal Seguridad Ciudadana ha realizado y seguirá realizando las gestiones necesarias ante los interesados correspondientes para que sea entregado el permiso de uso de infraestructura del proyecto y permiso de intervención de vías y espacio público.

## "SERVICIO CON PROBIIDAD"

Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460  
 Complejo industrial: Cra 48 N° 46-06 Sur Conmutador 7400656 - 5640768  
[www.forpo.gov.co](http://www.forpo.gov.co)

**TABLA DE CONTENIDO**

	Pág.
1. GRUPOS 4: UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD NACIONAL 2015.	3.
2. AVANCES DE FASES PROYECTO DE CCTV ACACIAS (META).	3.
3. PAQUETES DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA	4.
4. ESTADO DE PERMISOS.	7.





150893.

24

TODOS POR UN  
<http://sala.pereira.gov.co>

**FONDO ROTATORIO DE LA F  
"SERVICIO CON PROBIID"**

ALCALDIA DE PEREIRA  
Subsección No. 50093-2015  
Fecha: 01/09/2015  
Recibido por: JOSE MARCELO BUITRAGO  
Destino: Fondo Rotatorio de Servicio con Probiid



Bogotá, 01-09-2015

Doctor  
**ENRIQUE ANTONIO VÁSQUEZ ZULETA**  
*Alcalde Municipal*  
Carrera 7 No. 18-55 Piso 4  
Pereira - Risaralda

Atención:  
**Ingeniero NELSON LÓPEZ LONDOÑO**  
Supervisor del Convenio Interadministrativo 1915 de 2014  
e-mail: [contactenos@pereira.gov.co](mailto:contactenos@pereira.gov.co); [beatrizramirez@gmail.com](mailto:beatrizramirez@gmail.com)

Asunto: Informe de ejecución No.4 Convenio Interadministrativo 1915 de 2014.

En cumplimiento a las obligaciones contraídas por nuestra Entidad en el marco del Convenio Interadministrativo 1915 de 2014, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR LOS TRÁMITES PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES NECESARIOS CON EL FIN DE REALIZAR LA "ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD (SIES), CONJUNTAMENTE CON EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA", me permito remitir el informe preparado por nuestro supervisor respecto a la ejecución del convenio, para el periodo Mayo 21 - Agosto 20 de 2015. Para cualquier información adicional puede comunicarse con nuestro supervisor designado cuya información de contacto es la siguiente:

Nombre: Subteniente **SERGIO ANDRÉS PINEDA VELÁSQUEZ**  
Número de teléfono celular: (311) 886 2648  
Correo electrónico: [sergio.pineda1034@correo.policia.gov.co](mailto:sergio.pineda1034@correo.policia.gov.co)

Atentamente,

Administradora Pública **ROSSANA DÍAZ GÓMEZ**  
Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos  
Anexo Informe en 7 folios.  
Escribió: Mg. Elena García Vélez - Proctora de Defensa LEGAL EGV  
Ubicación: COCONTRATO INTERADMINISTRATIVO F124-2014



Sede Administrativa: Cra. 60A No. 43-18  
Commutador: 2200480  
Complejo Industrial: Cra. 48 N° 46-08 Sur  
Commutador 7400558 - 5640788  
[www.pereira.gov.co](http://www.pereira.gov.co)



F-3.4-01V12

**TABLA DE CONTENIDO**

	Pág.
1. GRUPOS 4: UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD NACIONAL 2015.	3.
2. AVANCES DE FASES PROYECTO DE CCTV ACACIAS (META).	3.
3. PAQUETES DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA	4.
4. ESTADO DE PERMISOS.	7.





<b>Clasificación</b>	Correspondencia General		
<b>Fecha de radicación:</b>	07 de septiembre de 2015	<b>Número de radicado:</b>	50893
<b>Tipo de documento:</b>	Carta	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	ROSSANA DIAZ GOMEZ		
<b>Descripción o asunto:</b>	INFORME DE EJECUCION N° 4 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1915 DE 2014	<b>Tiempo de respuesta (días):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	4
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA - Auxiliar Administrativo, MILENA CARDONA AGUDELO - Contratista, NELSON LOPEZ LONDOÑO - Subsecretario De Tecnologia Informatica	<b>Copia a:</b>	-

