



**CONSORCIO INTERVENTORÍA
VÍA DE ACCESO**

**ANTLIA-
AC S.A.S.**

Bogotá D.C., Agosto 01 de 2017
CINP-BTA-405-0024-1480

Señores:
ALCALDIA DE PEREIRA
ING. MAURICIO RESTREPO LONDOÑO
Secretaría de Infraestructura
Carrera 7 No.18 – 55
Pereira

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **35340-2017**

Fecha: 02/08/2017-17:31:17

Recibido por: SANDRA MILENA BETANCOURT ARISTIZABAL

Destino: 2.5. Secretaría de Infraestructura

Anexos: 4

REF.: Contrato No. 3287 de 2017. Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato obras de urbanismo y exteriores de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Matecaña.

ASUNTO: Remisión de informe semanal No. 2 de Interventoría.

Cordial Saludo:

Para su información y fines pertinentes adjunto a la presente estamos remitiendo el informe semanal No. 2 de seguimiento del contrato de la referencia correspondiente al periodo del 24 de Julio al 30 de Julio de 2017.

Cordialmente;


YUDY PATRICIA ROLON AMAYA
Representante Legal.



Elaboró: ZMRG

Revisó: DFCC

Anexos: Lo enunciado en cuatro (04) folios.

AVDA 19#120-71 OF 104
TEL: 3562690-3562691
Bogotá-Colombia

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 2 Cto. DE OBRA No. 3046 DE 2017 PERIODO: DEL 24 al 30 de JULIO de 2017		Versión: 1 Fecha: jun-15 Página 1 de 4
CONTRATO DE OBRA No	3287 de 2017			
OBJETO DEL CONTRATO	Obras de urbanismo y exteriores de la Nueva Terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Matecaña			
LOCALIZACION	Aeropuerto Internacional Matecaña			
CONTRATISTA	Consortio DB Matecaña - Contrato de Obra N°3046 de 2017			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$8.762.195.569			
FECHA DE INICIACION	jueves, 13 de julio de 2017			
PLAZO	SIETE (7) MESES DÍAS CALENDARIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2017			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA VÍA DE ACCESO			
PERIODO DEL INFORME	22 al 28 de Julio de 2017			
PERSONAL DEL CONTRATISTA	CARGO	CANT	CARGO	CANT
	Consortiado	2	Maestros	1
	Director de Obra	1	Oficial	2
	Residente de Obra	1	Ayudante	14
	Residente SST	1	Celador	1
	Residente ambiental	1	Operador de maquinaria	2
	Residente programación y calidad	1	Conductor Volqueta	10
	Asesor Social	1	Vigilancia	3
	Topógrafo	1	Batería sanitaria	1
	Cadenero 1	1		
	Cadenero 2	1		
	Inspector de obra	1		
	Auxiliar Administrativa	2		
	Almacenista	1		
	Arqueología	6		
Total Administración	21	Total Operativa	34	
TOTAL ADMIN. + OPERATIVO	55	PORCENTAJE PERSONAL DE LA ZONA	100,00%	
PERSONAL DEL INTERVENTOR	CARGO	CANT	CARGO	CANT
	Director de Obra	1	Residente SST	1
	Residente de Interventoría	2	Residente Ambiental	1
	Ingeniero Auxiliar	1	Asesor Social	1
	Inspector de obra	1	Asesor Programación y Calidad	1
	Apoyo Administrativo	1		
	Contador	1		
	Mensajero	1		
TOTAL PERSONAL	12			
SEÑALIZACION DE LA OBRA	DESCRIPCION	CANT	OBSERVACIONES	
	Paletas control vial	2	A la fecha e contratista no ha realizado el plan de contingencia vial; la Interventoría reitera la necesidad de implementar dicho plan respondiendo a las necesidades del proyecto y brindando seguridad a los usuarios de la vía.	
	Polisombra			
	Yute	362		
	Delineadores	25		
	Maletines			
Luces rutilantes				
REPORTE DE ACCIDENTES	A la fecha no se reportan eventos de incidentes - accidentes			
ACCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	El contratista continua vinculando personal, verificándose la afiliación a la seguridad social, (ARL, EPS, AFP). Se verifica también los contrato laborales, para cada persona, firmados por el trabajador.			
	Se evidencia la adquisición de inmovilizadores de extremidades, como complemento para atención de primeros auxilios.			
	Se evidencia inducción al personal nuevo, y se evidencia registro de éstas.			
	Para la actividad de retiro de material, se evidencia, en el área afectada, la instalación de señalización informativa de entrada y salida de volquetas y trabajos en la vía, sobre la vía de entrada que conduce a la torre de control.			
	Se evidencia instalación de cerramiento en la zona de la glorieta y de los árboles ubicados en esta zona. Se continua a la espera del Plan de Contingencia Vial.			
	Se evidencia la instalación de señalización informativa en el área de campamento. Se evidencia cartelera de SST, con publicaciones informativas del área de SST. Se evidencia certificado, vigente, de mantenimiento del armamento que usa el personal de vigilancia privada.			
	Se continúa evidenciando la tenencia de una batería sanitaria portátil y un mantenimiento semanal y un baño en el campamento.			

 <p>ALCALDIA DE PEREIRA</p>	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 2 Cto. DE OBRA No. 3046 DE 2017 PERIODO: DEL 24 al 30 de JULIO de 2017	Versión: 1 Fecha: jun-15 Página 1 de 4		
ACCIONES DE MANEJO AMBIENTAL	A la fecha se realiza retiro de material de descapote a los botaderos de Doña Faviola y El Batallón, los cuales cumplen con los permisos y para esta actividad. A la fecha no se realiza ninguna afectación y/o intervención a especies arbóreas. Se realiza limpieza de la vía en zonas de ingreso y salida de volquetas.			
DESCRIPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO	Se realizan las siguientes actividades: VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO CERRAMIENTO GUADUA + LONA SINTETICA + MALLA GALINERO h= 2.10 CERRAMIENTO MALLA NARANJA PERFORADA + SEÑALIZADOR TUBULAR Replanteo de Obra y localización de glorieta de vía. Rocería de descapote en el KD+890. Cargue y retiro de Material de descapote. Desmonte de Kiosco de Enredaderas. TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 315 mm (12")			
CORRESPONDENCIA ENVIADA	ASUNTO	CONSEC. O FECHA	RESPUESTA	
	SOLICITUD PERMISO PARA INGRESO DE PERSONAL TECNICO	CNP-BTA-405-0022-1416 25/07/2017		
	REMISION INFORME SEMANAL No. 1 DE INTERVENTORIA	CNP-BTA-405-0023-1449 27/07/2017		
	CDM CDBM-07 3RAS OBS A LAS HOJAS DE VIDA	CNP-BTA-405-0054-1468 28/07/2017		
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	ASUNTO	CONSEC. O FECHA	RESPUESTA	
	PERSONAL PROFESIONAL	CDBM007		
CONTROL DE AVANCE DE OBRA	ESTADO DEL PLAZO		DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE
			15	8,72%
	INVERSION	VALOR SEMANAL	VALOR ACUMULADO	PORCENTAJE
	PROGRAMADA	\$ 25.857.014,40	\$ 50.860.356,97	0,58%
	EJECUTADA	\$ 117.890.237,94	\$ 182.487.245,94	2,08%
	DIFERENCIA	\$ 92.033.223,54	\$ 131.626.888,96	1,50%
ANALISIS DE ATRASO O ADELANTO		Se tiene un avance en la inversión del 1,5% respecto a la programación presentada por el contratista; este avance se refleja en las labores de Descapote mecánico y transporte.		
OBSERVACIONES	Se requiere implementar el plan de contingencia vial. El Contratista realizó la instalación de la valla del Proyecto. El contratista realizó entrega de los planes de calidad, plan SG-SST y Ambiental para revisión de la Interventoría. Durante la semana se realizó Comité de Asesores Socio - Ambiental y Comité Técnico.			
 PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO Director de Interventoría Consorcio Interventoría Vía de Acceso				

EN LA SIGUIENTE HOJA DEBE IR UNA GRAFICA CON LA CURVA DE INVERSION
 EN LA ULTIMA HOJA DEBE VENIR EL REGISTRO FOTOGRAFICO (UNA SOLA HOJA)
 Anexar el acta de comité de la semana anterior.




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 2

Cto. DE OBRA No. 3046 DE 2017
PERIODO: DEL 24 al 30 de JULIO de 2017

Versión: 1
Fecha: jun-15
Página 3 de 4

Flujo de Inversión						
Semana	Fecha	Programado	Programado acumulado	% Prog Acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado
Semana 1	16-jul-17	25.003.342,57	25.003.342,57	0,29%	64.597.008,00	64.597.008,00
Semana 2	23-jul-17	25.857.014,40	50.860.356,97	0,58%	117.890.237,94	117.890.237,94
Semana 3	30-jul-17	32.123.442,40	82.983.799,37	0,92%		
Semana 4	06-ago-17	24.567.398,86	107.551.198,22	1,23%		
Semana 5	13-ago-17	17.043.645,43	124.594.843,65	1,42%		
Semana 6	20-ago-17	9.091.247,41	133.686.091,06	1,57%		
Semana 7	27-ago-17	123.831.342,50	257.517.433,56	2,84%		
Semana 8	03-sep-17	303.198.384,74	560.715.818,30	6,40%		
Semana 9	10-sep-17	516.470.970,67	1.077.186.788,97	10,01%		
Semana 10	17-sep-17	303.516.923,31	1.380.703.712,28	13,45%		
Semana 11	24-sep-17	303.608.843,29	1.684.312.555,57	16,89%		
Semana 12	01-oct-17	538.488.915,64	2.222.801,47	20,76%		
Semana 13	08-oct-17	396.134.997,37	2.618.936,84	25,28%		
Semana 14	15-oct-17	277.877.513,84	2.896.814,68	28,41%		
Semana 15	22-oct-17	371.287.200,35	3.268.021,03	32,66%		
Semana 16	29-oct-17	400.746.543,40	3.668.767,43	37,23%		
Semana 17	05-nov-17	684.567.035,19	4.353.334,62	45,04%		
Semana 18	12-nov-17	657.914.693,65	5.011.249,27	52,55%		
Semana 19	19-nov-17	458.182.817,35	5.469.466,62	57,78%		
Semana 20	26-nov-17	218.013.848,79	5.687.515,41	60,27%		
Semana 21	03-dic-17	158.409.333,12	5.845.924,53	62,07%		
Semana 22	10-dic-17	179.209.384,08	6.025.308,61	64,12%		
Semana 23	17-dic-17	354.488.277,84	6.379.796,45	68,16%		
Semana 24	24-dic-17	303.313.793,64	6.683.110,09	71,90%		
Semana 25	31-dic-17	420.546.780,68	7.103.656,77	78,70%		
Semana 26	07-ene-18	134.007.055,05	7.237.711,82	80,23%		
Semana 27	14-ene-18	364.215.135,89	7.601.926,71	84,38%		
Semana 28	21-ene-18	727.065.714,67	8.328.992,38	92,68%		
Semana 29	28-ene-18	371.546.827,86	8.700.539,24	96,92%		
Semana 30	04-feb-18	232.451.078,32	8.932.990,56	99,58%		
Semana 31	11-feb-18	37.197.031,96	9.270.022,52	100,00%		

Obras de urbanismo y exteriores de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Matecaña
FLUJO DE INVERSIÓN

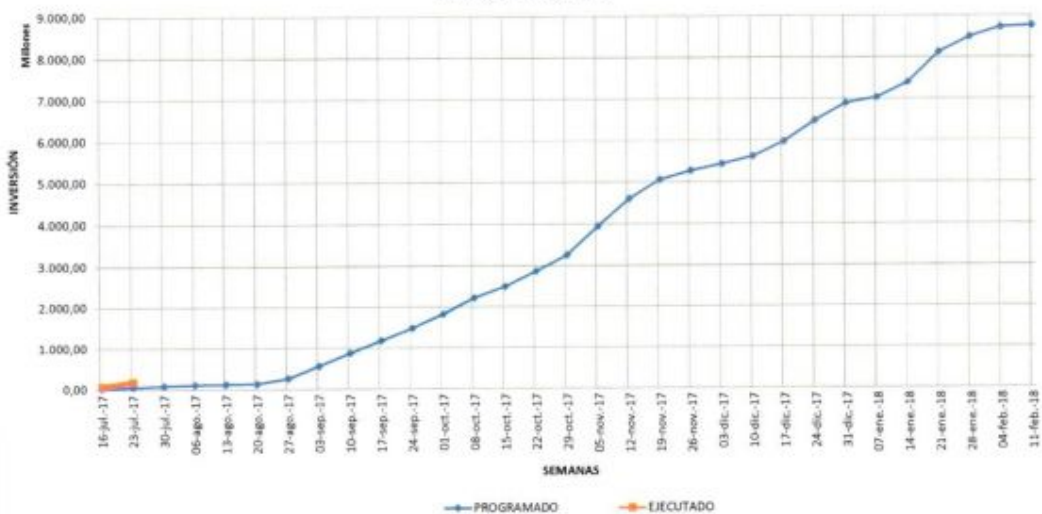



REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 2
Cto. DE OBRA No. 3046 DE 2017
PERIODO: DEL 24 al 30 de JULIO de 2017

Versión: 1
Fecha: jun-15
Página: 4 de 4

OBJETO: "Obras de urbanismo y exteriores de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Matecaña"



FOTO No.1, Uso de personal "PARE-SIGA", para el retiro de volquetas de la obra



FOTO No.2, Señalización "Entrada y salida de volquetas", "Trabajos en la vía"



FOTO No.3, Estado inicial de la vía K0+050



FOTO No.4, Zona de glorieta K0+870



FOTO No.5, Descapote Mecánico



FOTO No.6, Desmonte de Kiosco - Enrodaderas



FOTO No.7, CERRAMIENTO MALLA NARANJA PERFORADA + SEÑALIZADOR TUBULAR



FOTO No.8, Descapote y cargue de material para retiro.



Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	02 de agosto de 2017	Número de radicado:	35340
Tipo de documento:	DERECHOS DE PETICION	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	YUDY PATRICIA ROLON AMAYA		
Descripción o asunto:	CONTRATO	Tiempo de respuesta (días):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	4
Anexos digitales:			
Destino:	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura	Copia a:	-

